



Val-d'Or

# RENCONTRE D'INFORMATION

*Revitalisation*

— *Phase 4*

16 avril 2024



# Ordre du jour

1. Calendrier des travaux par Michael Sirois et Vincent Godbout (15 min)
2. Circulation et interventions dans la ruelle nord par Michael Sirois (5 min)
3. Communications et activités par Sylviane Mailhot (5 min)
4. Période de questions

# Calendrier des travaux

Prévisionnel – Du 22 avril au 19 septembre 2024

## GRANDES ÉTAPES

## Durée

Installation aqueduc temporaire

22 au 26 avril

Remplacements des conduites

29 avril au 7 juin

Aménagement de surface

10 juin au 19 septembre

# Calendrier des travaux

## Prévisionnel

### DÉTAILS

### Durée

Remplacement des conduites

29 avril au 7 juin

1. Signalisation et clôtures

1 jr

2. Enlèvement pavage et trottoir

2 jrs

3. Démolition équipements municipaux

3 jrs

4. Installation vanne d'isolation

1 jr

5. Conduite égout sanitaire, pluvial et aqueduc

20 jrs

6. Essaie sur aqueduc

2 jrs



23.05.2023 17:23



08.05.2023 16:53

# Calendrier des travaux

## Prévisionnel

### DÉTAILS

### Durée

\*Certaines tâches peuvent s'effectuer en simultanée

#### Aménagements de surface

10 juin au 19 septembre

1. Bases de béton	10 jrs
2. Conduites électriques	10 jrs
3. Fils électriques	5 jrs
4. Lampadaires	5 jrs
5. Bac de sol structural	10 jrs
6. Remblai MG-56 et MG-20	3 jrs
7. Trottoirs et bordures (mi-août environ)	20 jrs
8. Pavé uni	15 jrs
9. Pavage	5 jrs
10. Mobilier urbain	3 jrs
11. Nettoyage et démobilisation	5 jrs



11.07.2023 11:38








01.08.2023 09:40

# SÉCURITÉ - AMBIANCE - VERDISSEMENT

## TRAVAUX 2024 - PHASE 4


## TRAVAUX 2023

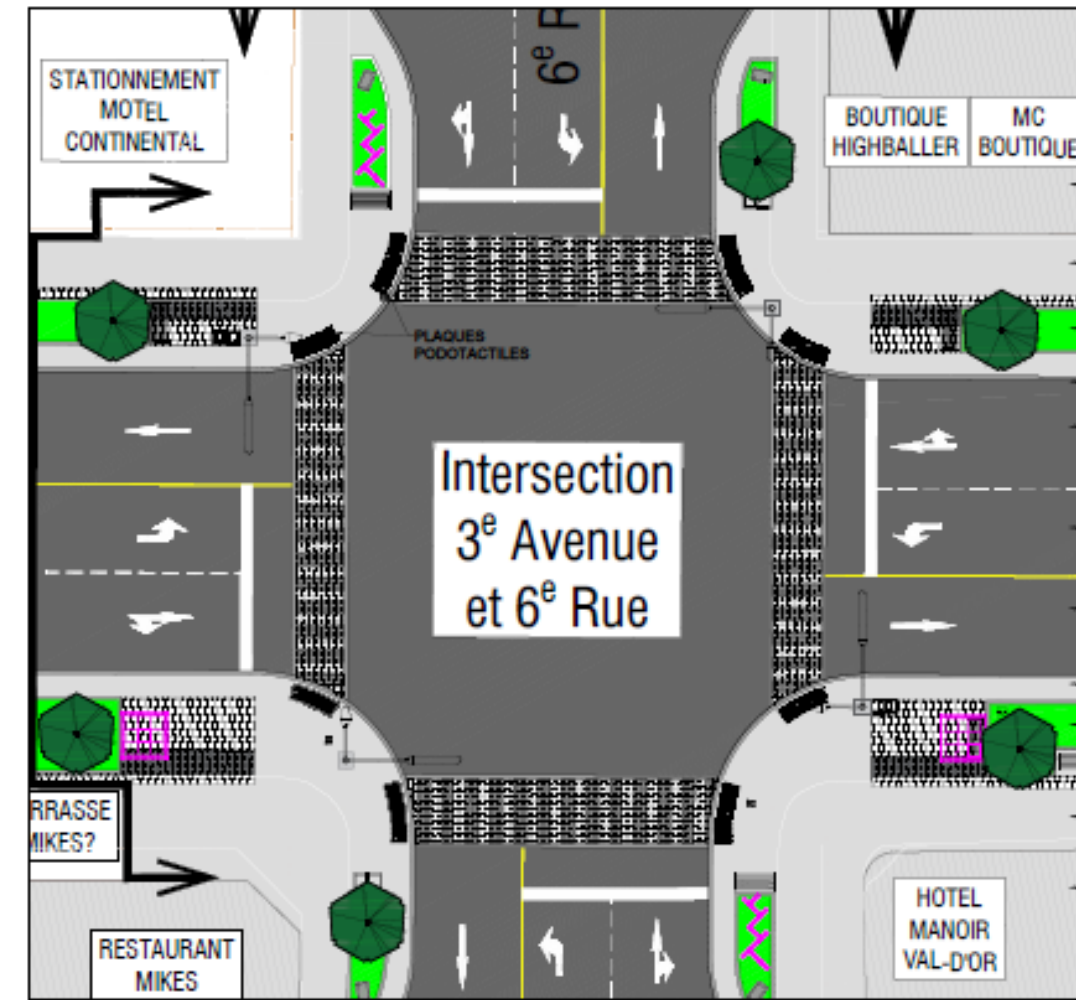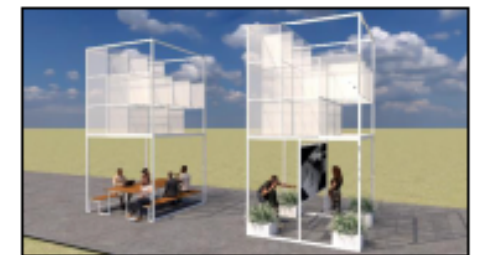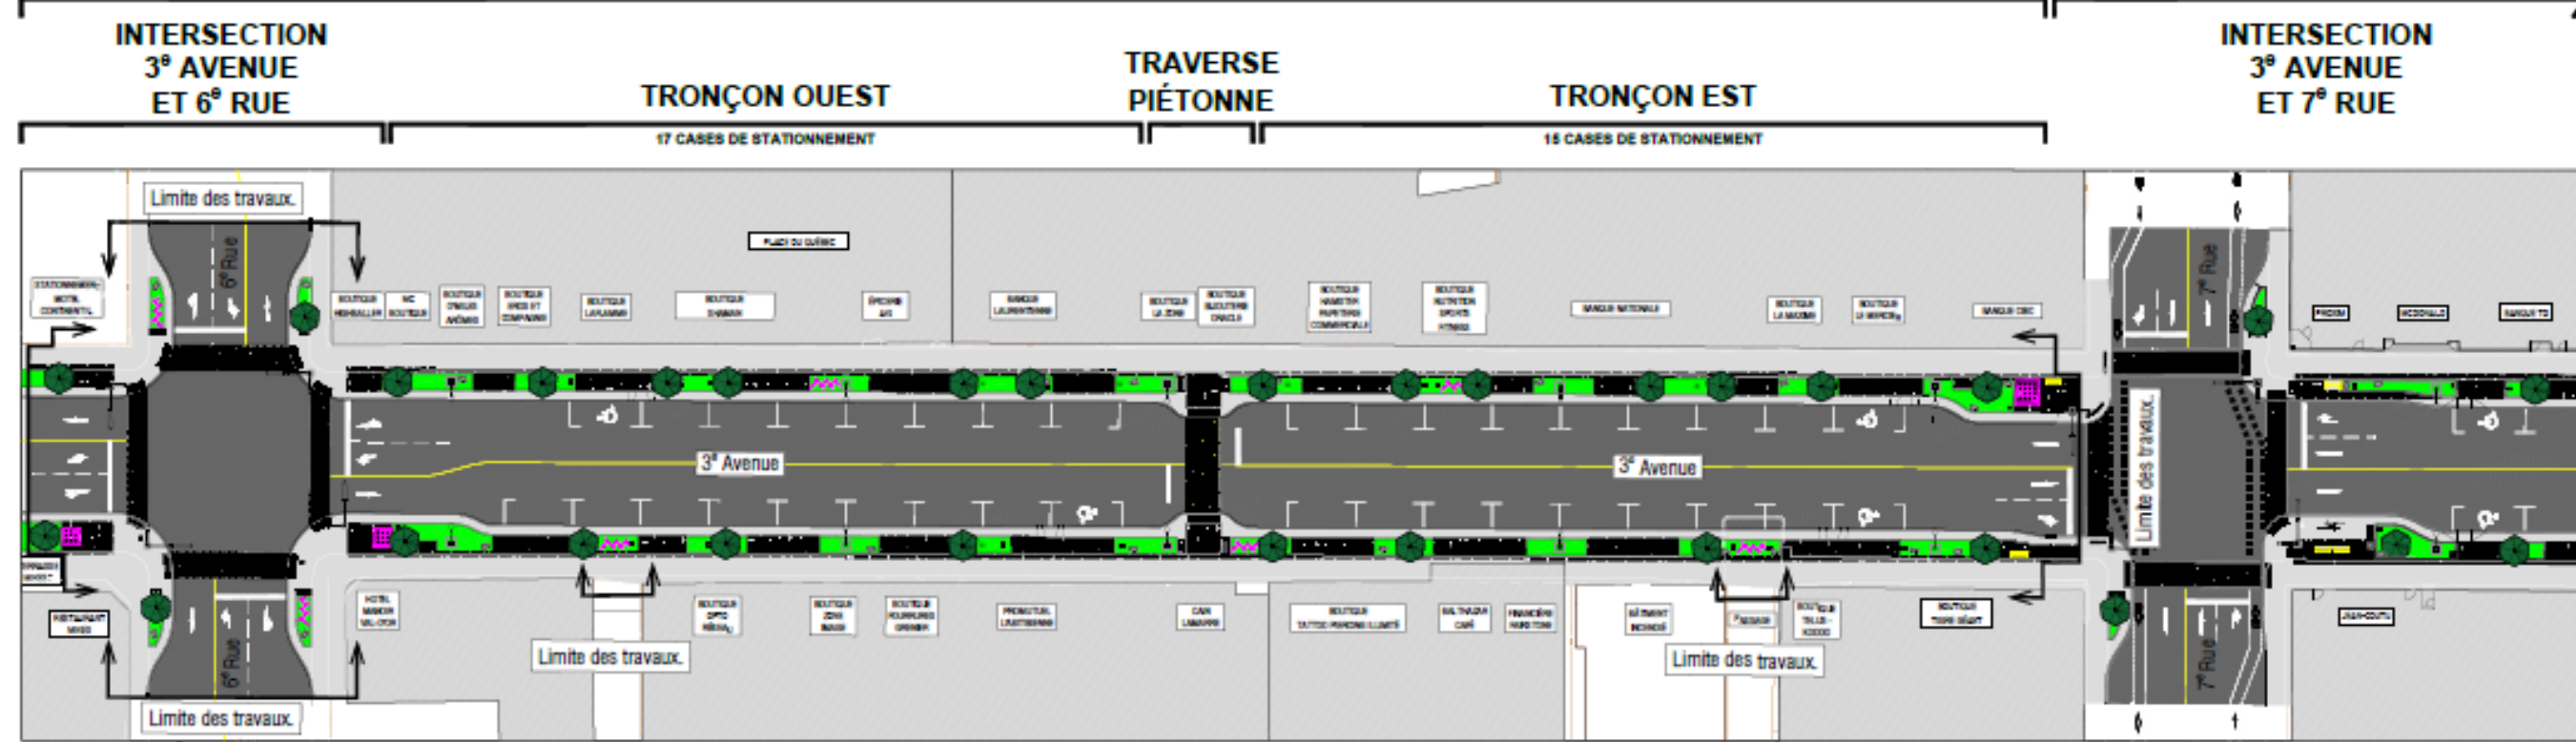

### PASSAGE COSTA



# Plan de circulation

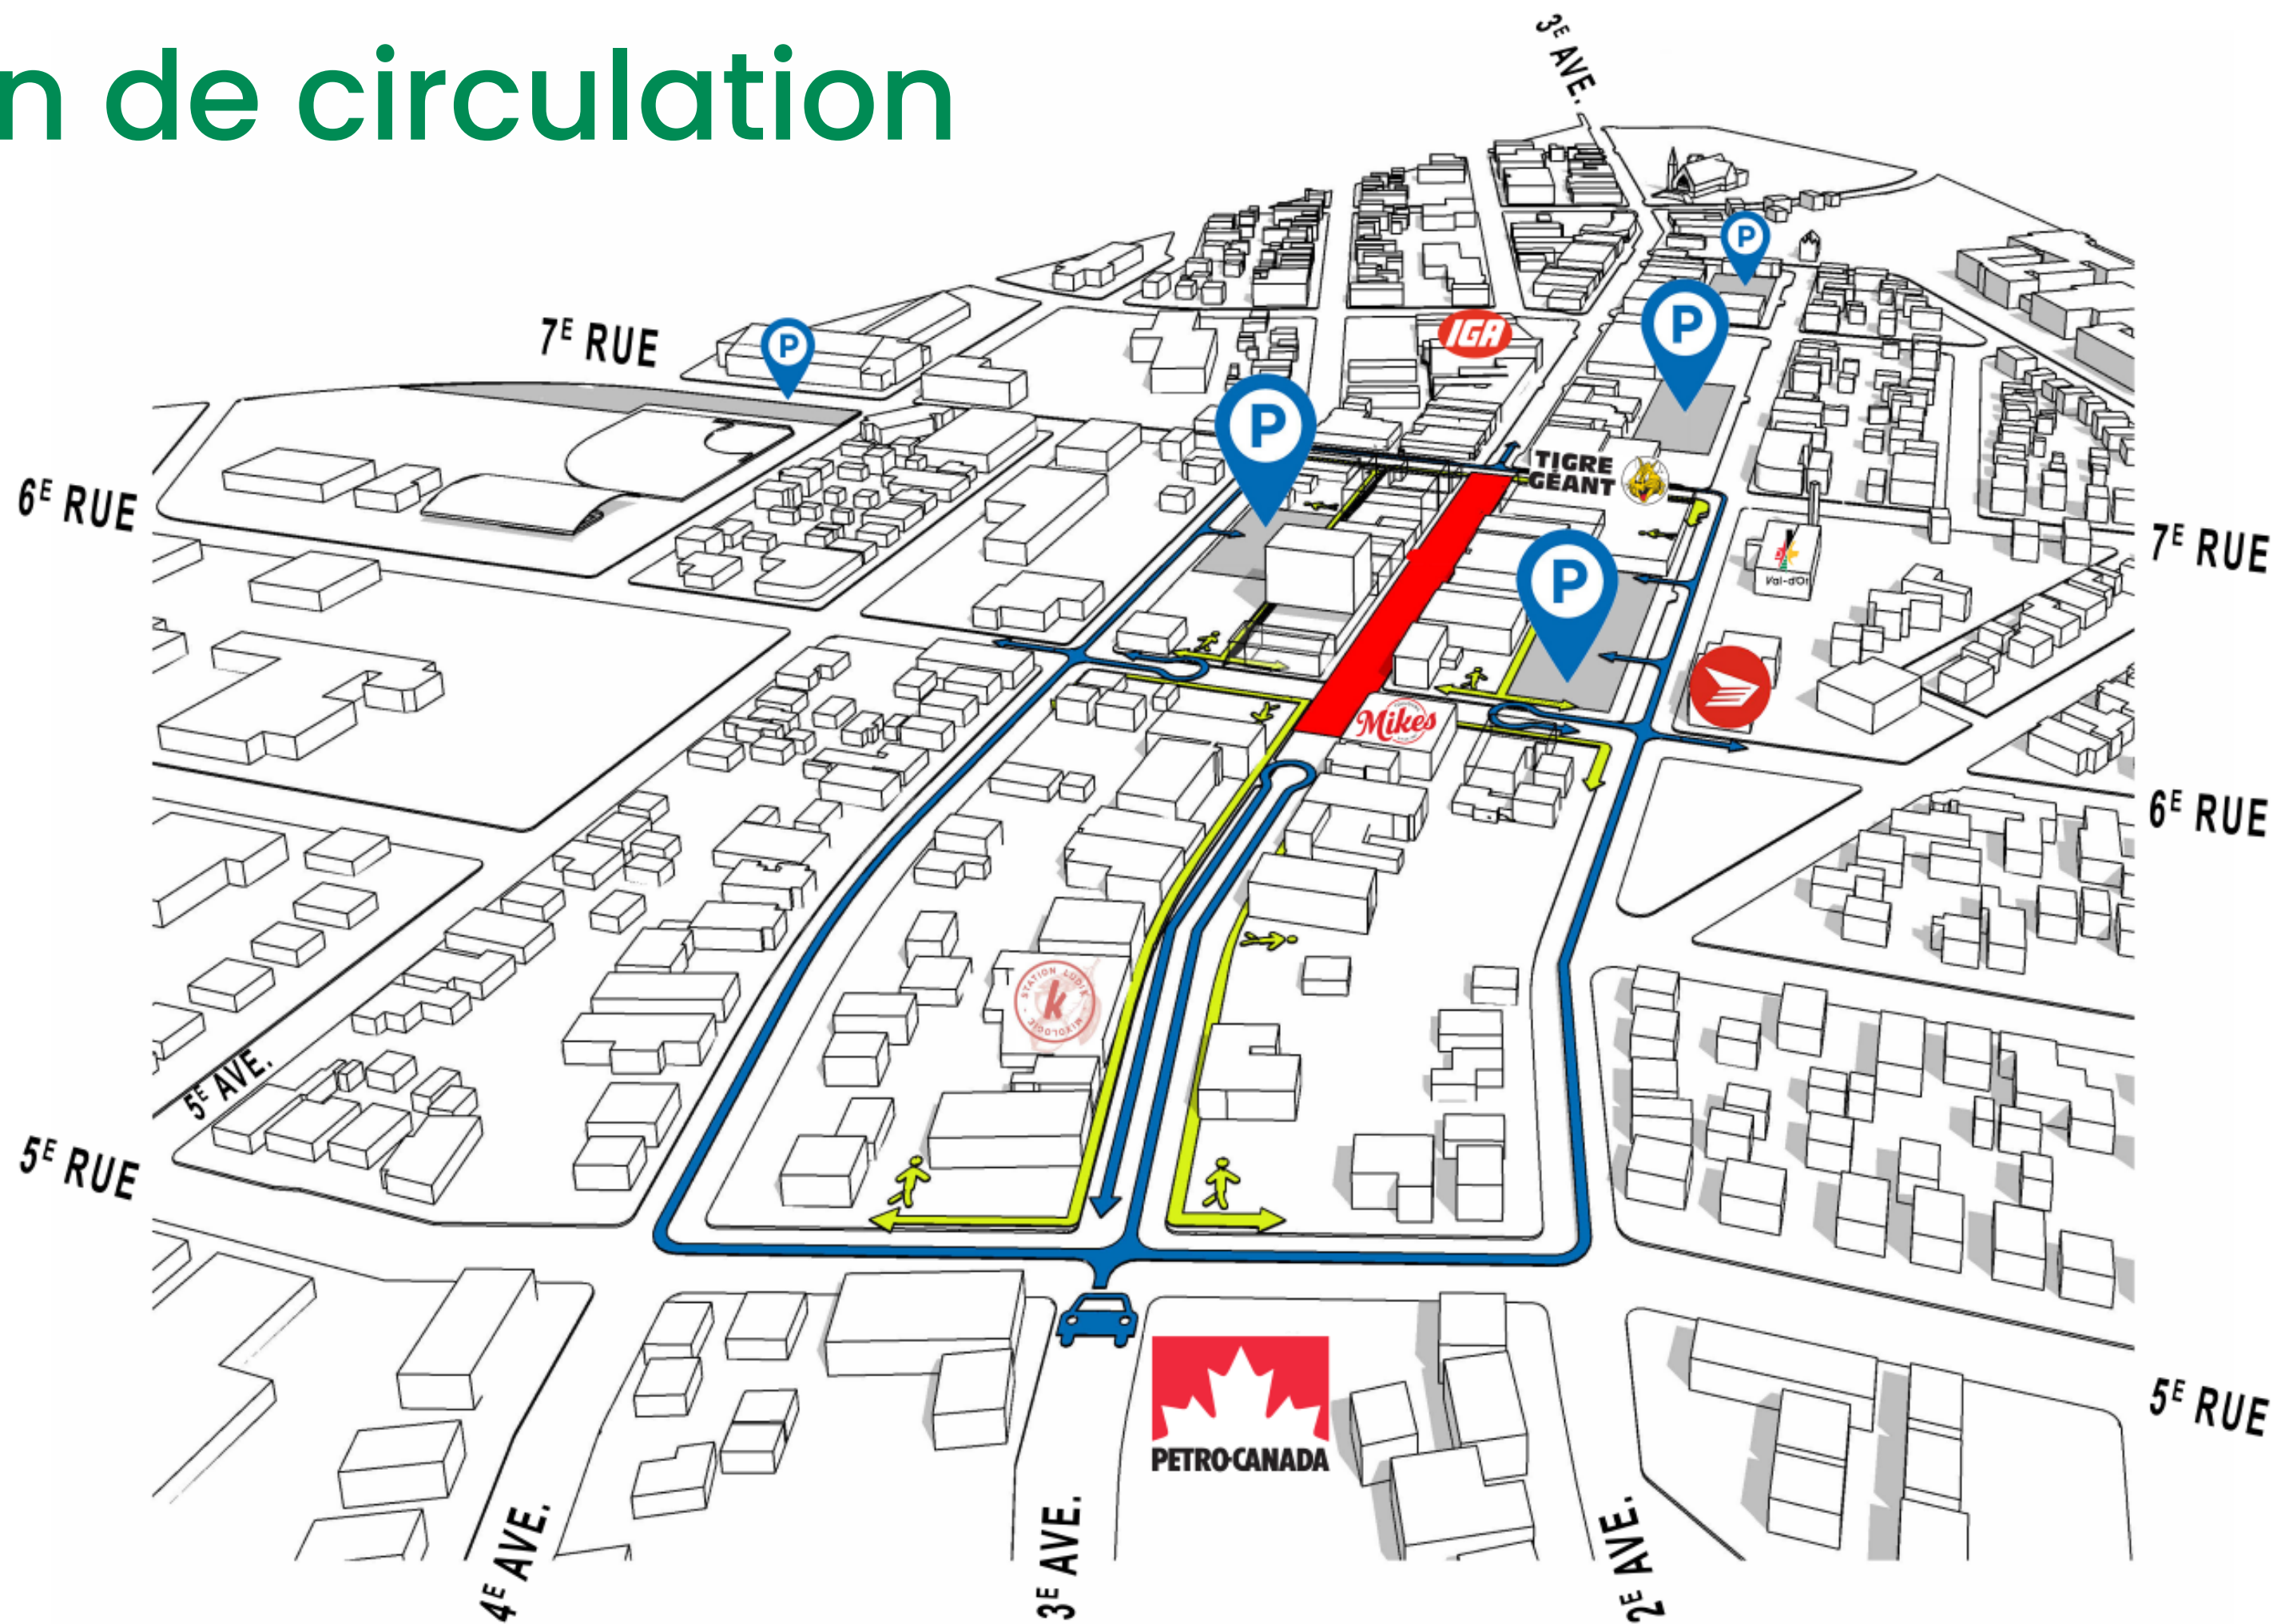

# Interventions ruelle côté nord



- Bacs à fleurs
- Signalisation
- Ruelle piétonne
- Stationnements privés et livraison seulement

**3D RUELLE NORD - PHASE 4**

Echelle: 1:1



**les  
avenues  
d'la** 

# Outils >



- Facebook
- Instagram
- Site web
- Système d'alertes citoyennes (texto/courriel/appels)
- Bulletin municipal
- Infolettre
- Campagne médiatique
- Communiqués de presse
- Affichage
- Etc.



# Personnes ressources

## ■ Surintendant de chantier

Michel Migué  
Duroking inc.

## ■ Chargé de projet

Samuel  
Beauchamp, ing.  
Duroking inc.

## ■ Chargé de projet

Michael Sirois, ing.  
Ville de Val-d'Or

## ■ Surveillance des travaux

Vincent Godbout,  
ing.  
Norinfra

## ■ Conseillère en urbanisme

Marianne Bédard  
Ville de Val-d'Or

## ■ Agente du patrimoine immobilier

Nathalie Faucher  
Ville de Val-d'Or

## ■ Directrice des communications

Sylviane Mailhot  
Ville de Val-d'Or





Val-d'Or

# RENCONTRE D'INFORMATION

*Revitalisation*

— *Phase 4*

16 avril 2024

